



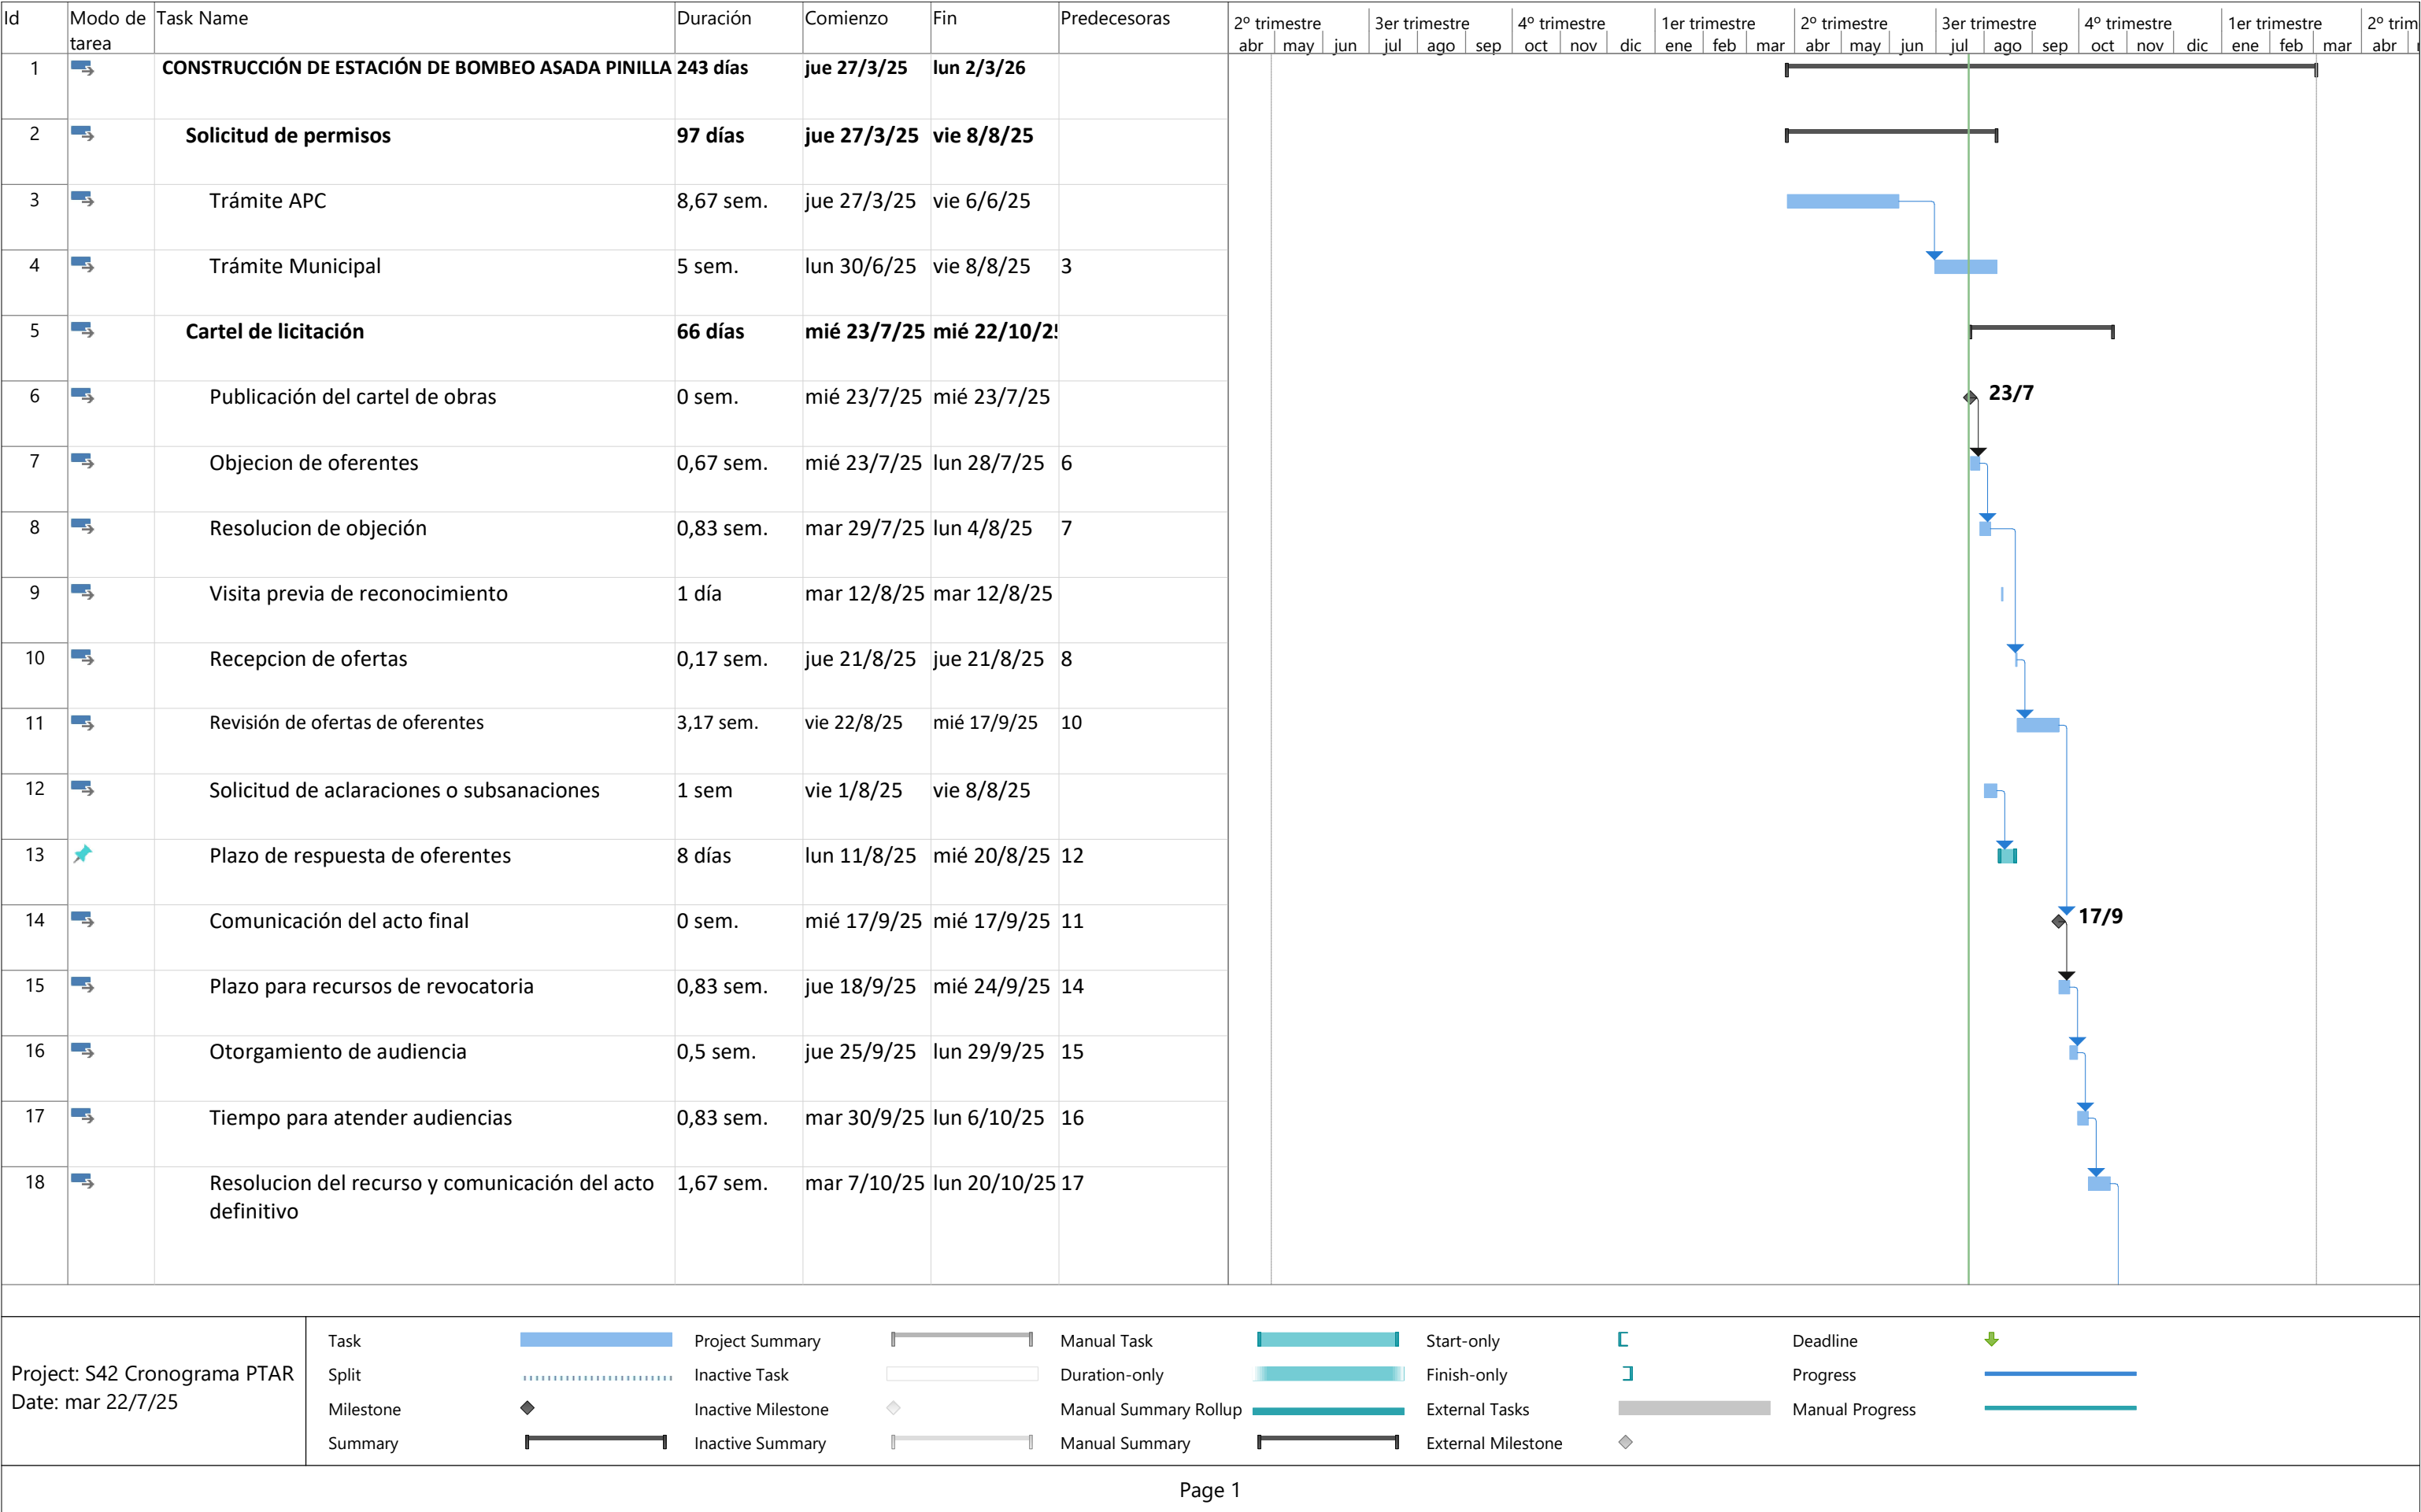

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre			2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre			2º trimestre	
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
19		Emisión de OC y oficialización de la adjudicación	0,33 sem.	mar 21/10/25	mié 22/10/25	18																										
20		Adquisición de equipamiento	72 días	vie 31/10/25	lun 9/2/26																											
21		Sistema de bombeo booster	12 sem.	vie 31/10/25	lun 9/2/26	19FC+1 sem																										
22		Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio	8 sem.	vie 31/10/25	mar 6/1/26	19FC+1 sem																										
23		Sistema de monitoreo de cloro en línea	8 sem.	vie 31/10/25	mar 6/1/26	19FC+1 sem																										
24		Obras	81 días	lun 10/11/25	lun 2/3/26																											
25		Obra Civil	10 sem.	lun 10/11/25	vie 30/1/26	19FC+2 sem.																										
26		Obra Mecánica	8 sem.	vie 12/12/25	mar 17/2/26	25CC+4 sem.																										
27		Obra Eléctrica	8 sem.	vie 21/11/25	mar 27/1/26																											
28		Obra Control	8 sem.	vie 21/11/25	mar 27/1/26	27CC																										
29		Comisionamiento de equipos y ajuste	2 sem.	mié 28/1/26	jue 12/2/26	28																										
30		Pruebas de operación	2 sem.	vie 13/2/26	lun 2/3/26	29																										
31		Finalización del proyecto	0 sem.	lun 2/3/26	lun 2/3/26	30																										

2/3



Project: S42 Cronograma PTAR
Date: mar 22/7/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress
